Safer Surfacing Replacement

Period Highlight: 20

Plan | Actual | % Complete
Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
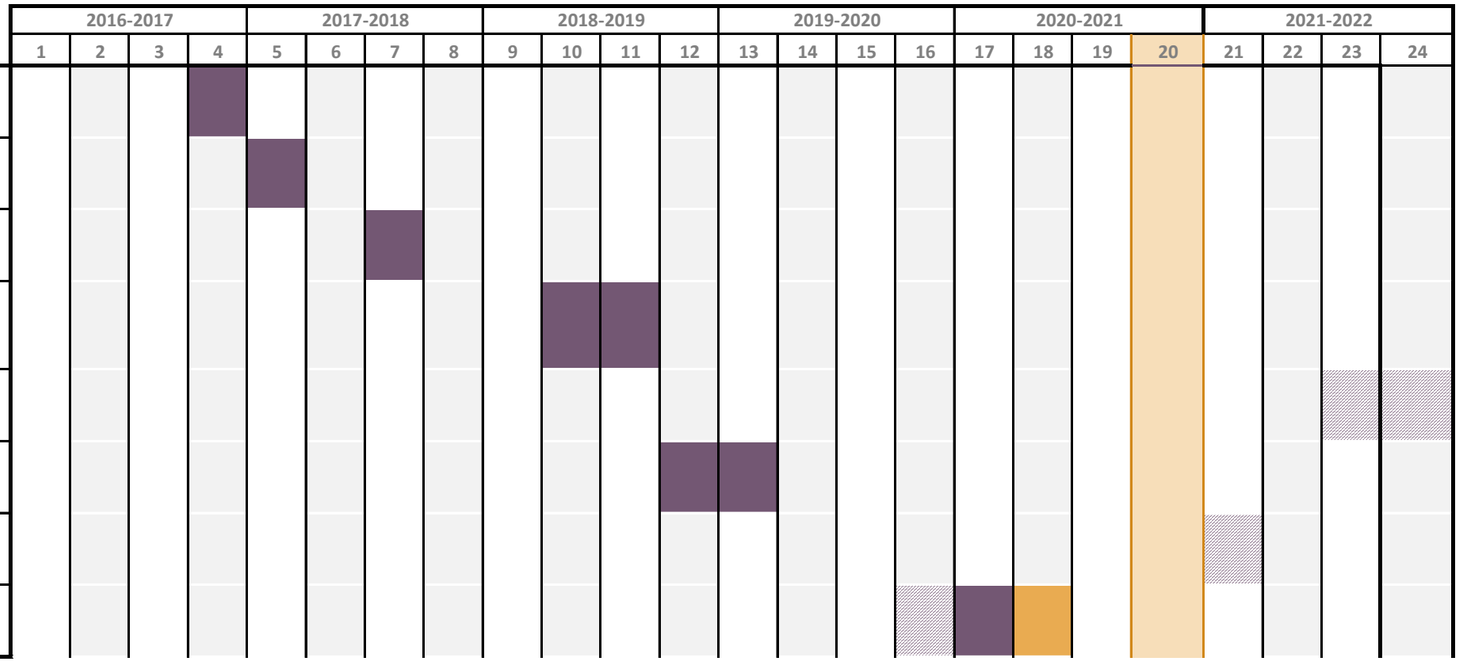
ACTIVITY	PLAN START	PLAN DURATION	ACTUAL START	ACTUAL DURATION	PERCENT COMPLETE
Mentmore Park - Junior	4	1	4	1	100%
Nicolson Drive	5	1	5	1	100%
Adams Bottom	7	1	7	1	100%
Linslade Recreation Ground	10	2	10	2	100%
Alwins Field	23	2	0	0	0%
Astral Park (Gym)	12	2	12	2	100%
Splash and Play	21	1	0	0	0%
Pages Park	16	2	17	2	100%
